

御名前 モガミ住研様企画

様

| | | | | | |
|------|----------|-------|------------------|-----|------------|
| 現場番号 | C3830569 | プラン番号 | 1305Z-2210-0354F | 作成日 | 2022/10/18 |
|------|----------|-------|------------------|-----|------------|

御見積明細 システムバス

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

| NO | 商品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----|----------------|--|----|---------|---------|
| 1 | ぴったりサイズエメロード | 間口1650mm×奥行1668mm | 1 | 532,000 | 532,000 |
| 2 | 架台 | 戸建タイプ 一体架台 | 1 | | |
| 3 | ドア | 折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ) | 1 | | |
| 4 | ドア | 上部換気口 | 1 | | |
| 5 | 洗い場 | キープクリーンフロア(ホワイトグレー) | 1 | | |
| 6 | 排水口カバー | ステンレス | 1 | | |
| 7 | 浴槽 | ステンレス浴槽(高断熱浴槽)(ホワイト) | 1 | | |
| 8 | エプロン | カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト) | 1 | | |
| 9 | 浴槽ハンドグリップ | 1本仕様 | 1 | | |
| 10 | 洗い場用水栓 | サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF9032SJN 水栓上部カウンター(ホワイト) | 1 | | |
| 11 | 洗い場用水栓 | 標準シャワーヘッド:KF9032SJN | 1 | | |
| 12 | 浴槽用水栓 | 浴槽側水栓なし | 1 | | |
| 13 | カウンター | ワイドカウンター | 1 | | |
| 14 | シャワーフック/スライドバー | シャワーフック | 1 | | |
| 15 | 浴室パネル | レギュラークラス(Kパネル) | 1 | | |
| 16 | 浴室パネルタオル穴 | タオル掛け穴あり | 1 | | |
| 17 | 窓枠フリー | 窓枠フリー(樹脂タイプ)L1512 W | 1 | +19,500 | +19,500 |
| 18 | 天井 | フラット天井 | 1 | | |
| 19 | 換気機器 | 天井換気扇ホワイト | 1 | | |
| 20 | 換気機器開口 | 工場開口 | 1 | | |
| 21 | 照明 | 天井付ミニ照明(昼白色) | 1 | | |
| 22 | 天井照明開口 | 工場開口 | 1 | | |
| 23 | ミラー | 横長クリアミラー | 1 | +14,500 | +14,500 |
| 24 | 風呂フタ | 断熱風呂フタ<MLH-1240WN> | 1 | +14,000 | +14,000 |
| 25 | タオル掛け | スクエアタイプ | 1 | +1,500 | +1,500 |
| 26 | 収納棚 | スクエアタイプ(2段)<ホワイト> | 1 | +1,200 | +1,200 |
| 27 | どこでもラック | タオルハンガーL(ホワイト) | 1 | +2,800 | +2,800 |
| 28 | どこでもラック | 風呂フタフック(ホワイト) | 1 | +2,100 | +2,100 |
| 29 | 循環金具セット | ELX | 1 | +10,500 | +10,500 |
| 30 | 給水給湯管 | 洗い場1水栓 | 1 | | |

御名前 モガミ住研様企画 様

| | | | | | |
|------|----------|-------|------------------|-----|------------|
| 現場番号 | C3830569 | プラン番号 | 1305Z-2210-0354F | 作成日 | 2022/10/18 |
|------|----------|-------|------------------|-----|------------|

御見積明細 システムバス

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

| NO | 商品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----------|---------|-------------|----|----|----------|
| 31 | トラップカバー | 洗い場側トラップカバー | 1 | | |
| システムバス合計 | | | 31 | | ¥598,100 |

| | | |
|-------|----|----------|
| 商品総合計 | 31 | ¥598,100 |
|-------|----|----------|

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥102,500 (税込 ¥112,750)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。


カウンター面
 浴槽側面 洗場側面
 カウンター対面
 ■留意事項
 ※印寸法は給水給湯管の
 突出寸法18mmを含みます。

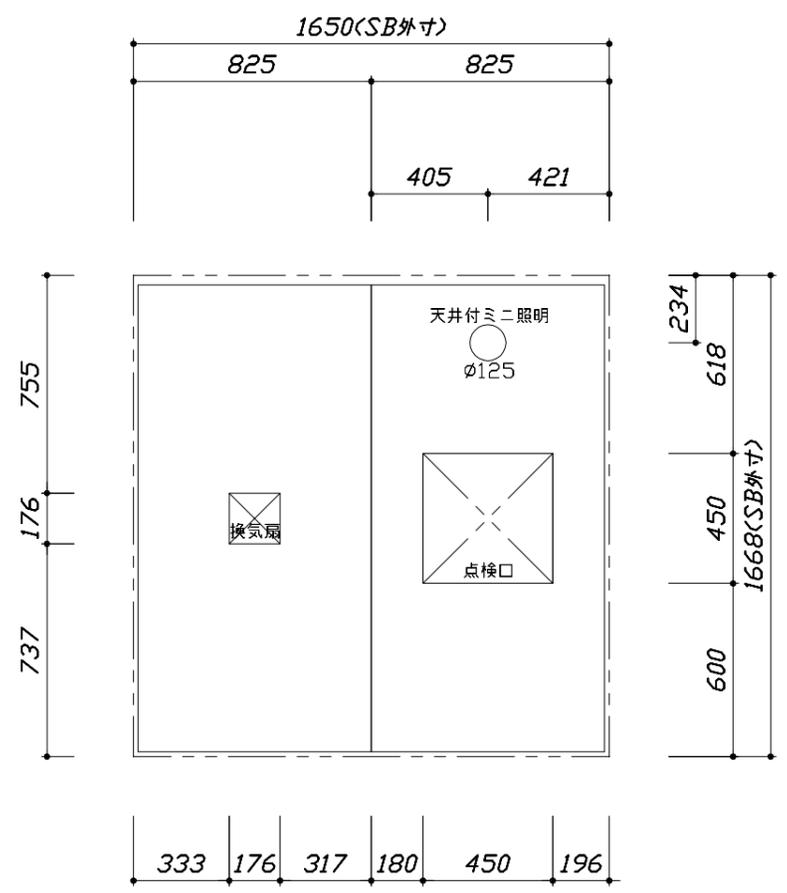

< 天井伏図 >

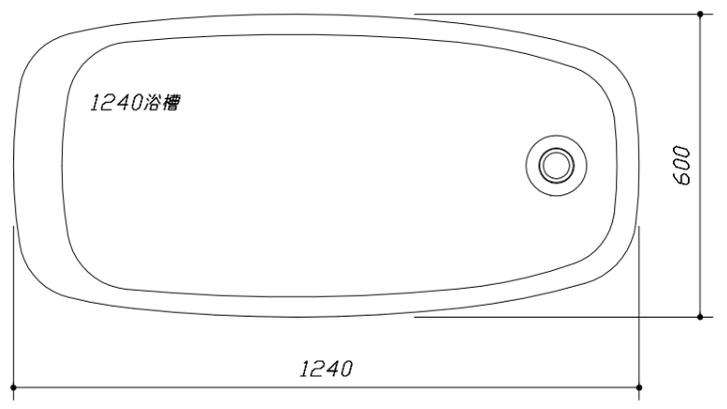



< 浴槽詳細図 >

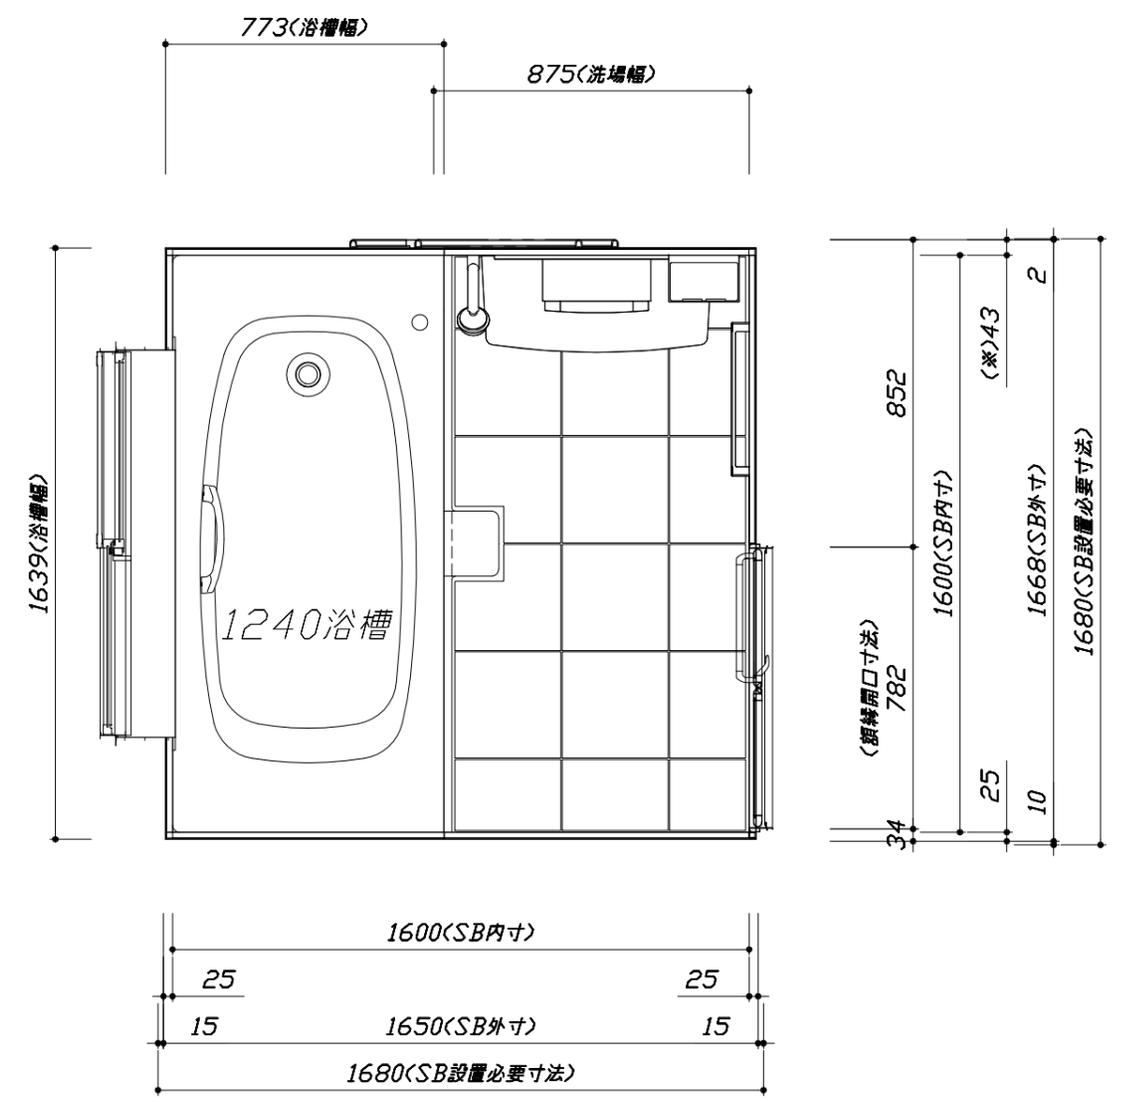

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
- ・大きさ、設置位置等確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。

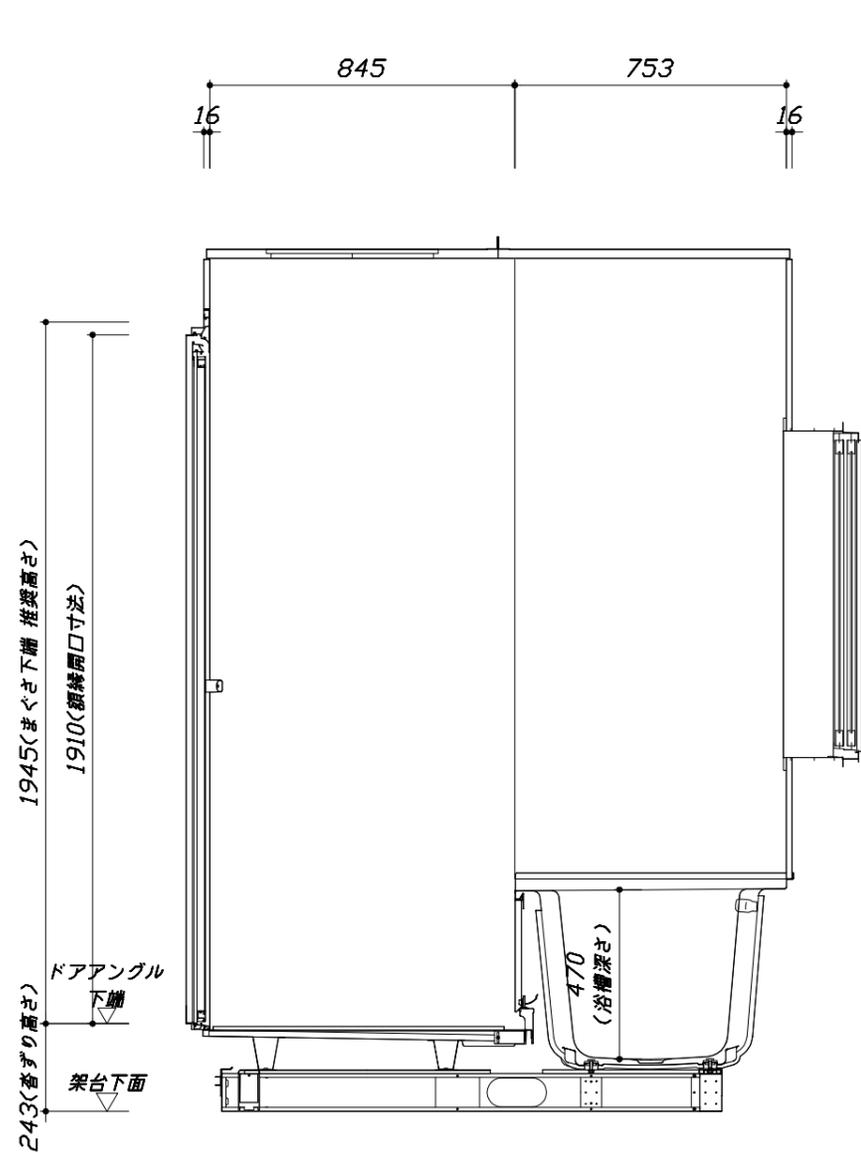

<カウンター対面図>


■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

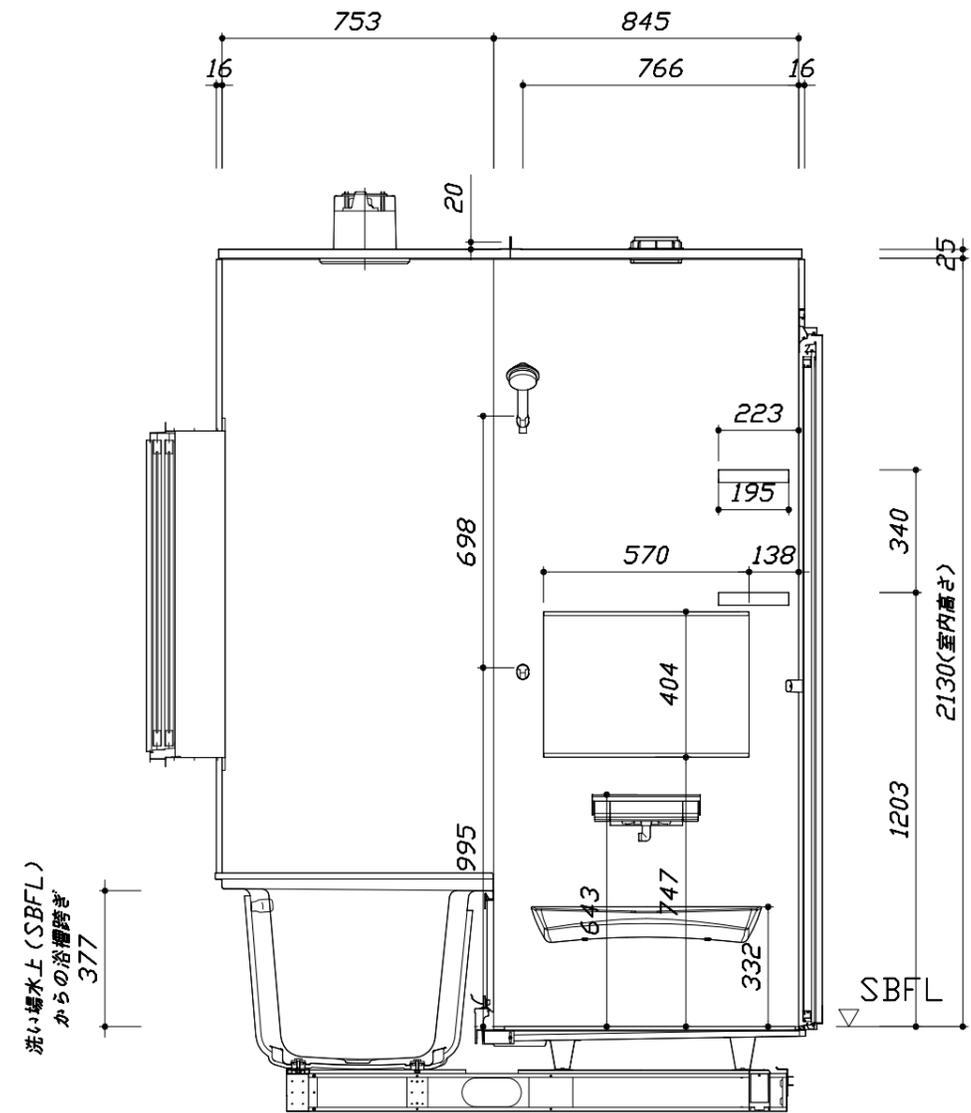

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
- ・大きさ、設置位置等確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法をご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。

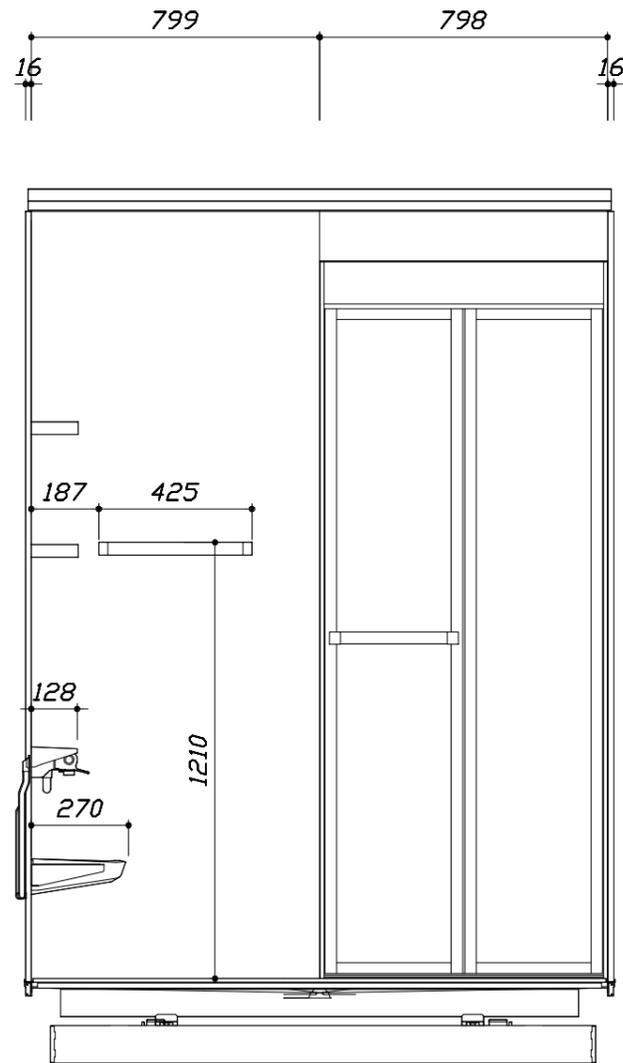

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

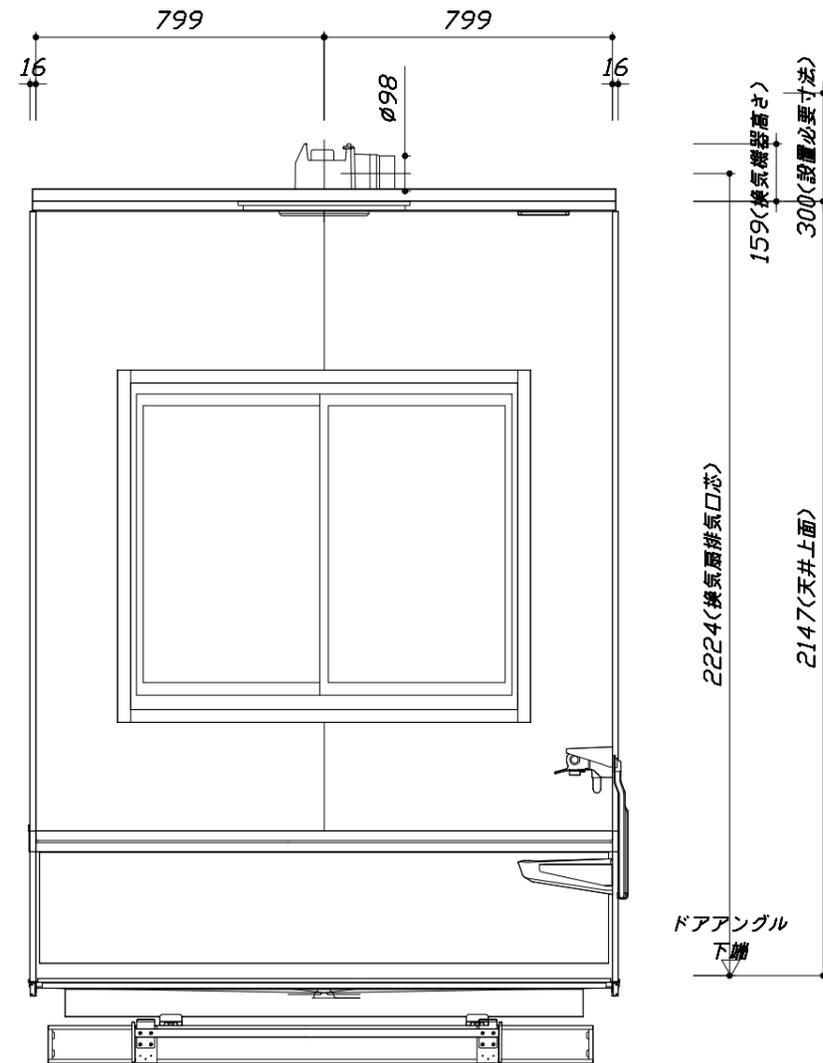

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

| | |
|--------|------------------------------------|
| ドア勝手 | BL勝手 |
| 架台 | 一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板 |
| 洗場パン | キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵 |
| 浴槽材質 | ステンレス 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン） |
| 浴槽形状 | ラウンド浴槽 グリップ付（1240浴槽・260リットル） |
| 浴槽パン | － |
| 浴槽エプロン | ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン） |
| カウンター | ワイドカウンター：ABS樹脂 |
| 浴室パネル | パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：あり |
| 天井 | 化粧サドル（内部発泡樹脂）換気機器開口：あり 天井照明開口：あり |
| ドア | キープクリーンドア：19高さ折戸（アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口） |
| 窓1 | 現地手配 |
| 窓2 | － |
| 窓枠1 | ABS樹脂 W：ホワイト |
| 窓枠2 | － |
| 排水トラップ | 洗い場：ABS樹脂、 浴槽：ASA樹脂 封水50mm |
| 雑排水配管 | 硬質塩ビパイプ VU50 |
| | |
| | |

アクセサリ仕様表


| | |
|--------|-------------------------------------|
| ミラー | 横長クリアミラー くもり止め加工 |
| 収納棚 | スクエアタイプ：ABS樹脂製（2段） |
| タオル掛け | スクエアタイプ(ホワイト)：ABS樹脂製 |
| 洗場側水栓 | サーモスタット(KVK KF9032SJN) (樹脂ホース:シルバー) |
| 浴槽側水栓 | － |
| 兼用水栓 | － |
| スライドバー | － |
| 照明 | 天井付ミニ照明 (LED 6.5W昼白色) |
| 換気機器 | 天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ダクト径φ98) |
| フロタ | 保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚) |
| 給水給湯管 | 銅管(10A) |
| 循環金具 | 循環金具セットELX：ホース先端部R1/2オスネジ仕様 |
| ハンドバー① | － |
| ハンドバー② | － |
| ハンドバー③ | － |
| ハンドバー④ | － |
| ハンドバー⑤ | － |
| ハンドバー⑥ | － |
| ハンドバー⑦ | － |

本体カラー

| | |
|-------------|-----------------|
| 浴槽 | W：ホワイト |
| カウンター | W：ホワイト |
| パネル(カウンター面) | 色未定 |
| パネル(周辺・3面) | 色未定 |
| 水栓上部カウンター | W：ホワイト |
| 浴槽エプロン | W：ホワイト |
| 洗場 | BW：ホワイトグレー |
| ドア | W：ホワイト |
| 収納棚 | スクエアタイプ(W:ホワイト) |
| タオル掛け | スクエアタイプ(ホワイト) |
| ランドリーセット | － |

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

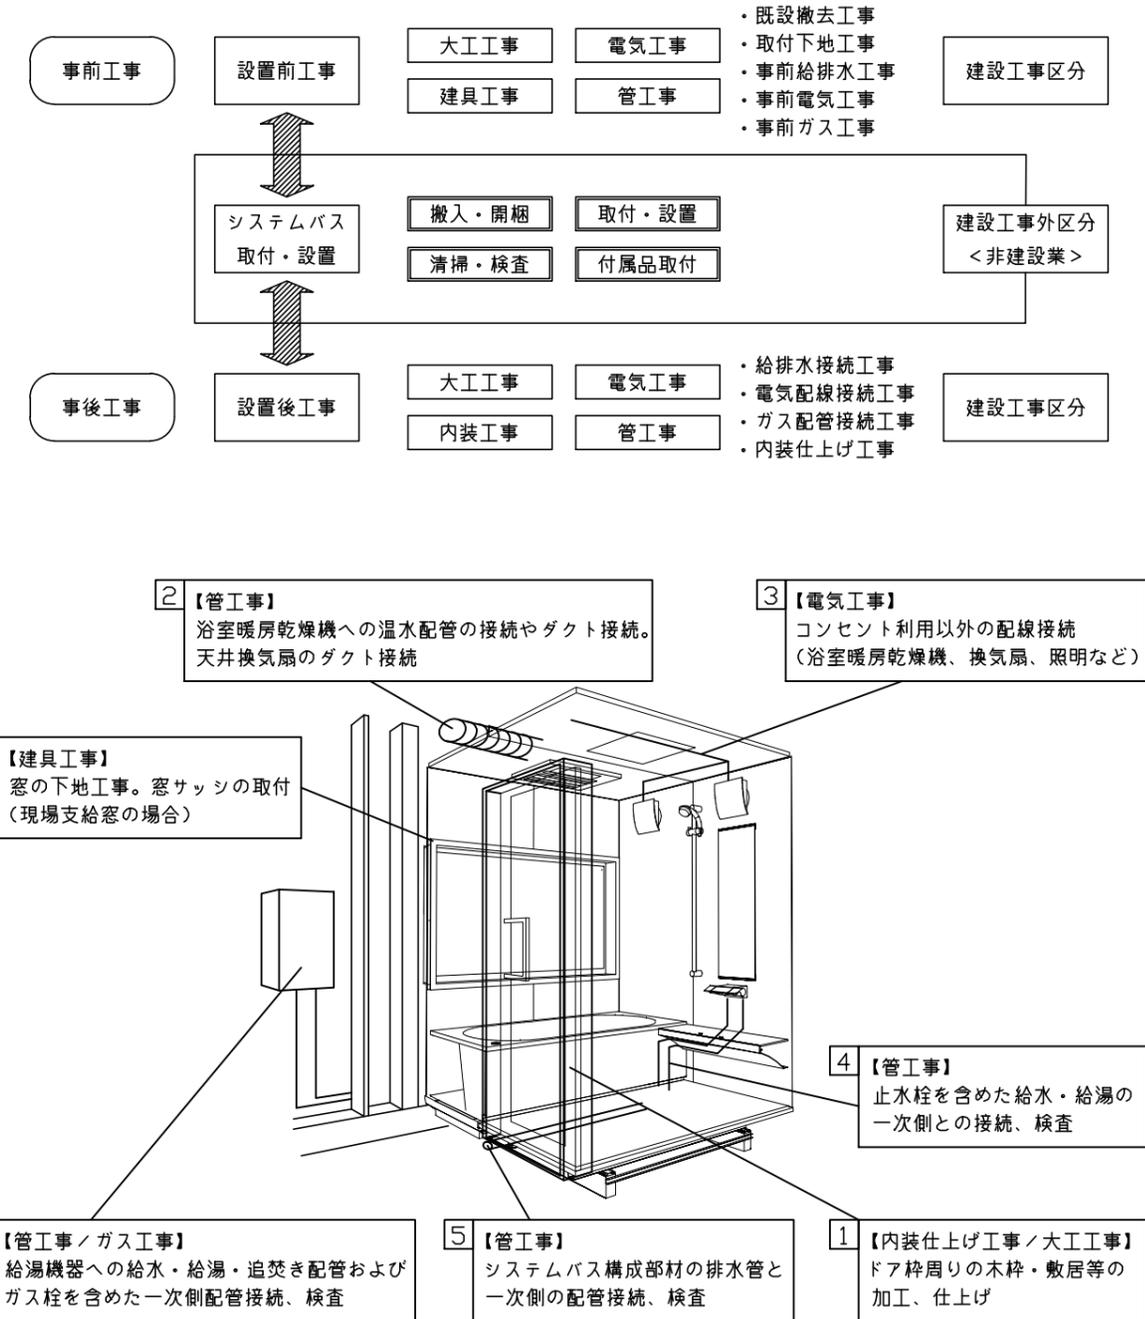

■システムバス 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

| 工事区分 | 部位 (図) | 業種区分 | 作業名称 (区分) | 建設工事 | | | | | 建設工事外 | | 作業内容 | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | 大工 工事 | と び 土 工 事 | 建 具 工 事 | 管 工 事 | 電 気 工 事 | 給 湯 機 器 設 備 | シ ス テ ム バ ス 設 置 | | | |
| 設置前工事 | 1 2 3 | 大工 土工 建具 | 設置基礎、設置床の工事 | ○ | ○ | | | | | | 浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事 | | |
| | | | 浴室ドア、窓サッシの下地工事 | ○ | | ○ | | | | | 建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事 | | |
| | | 管 | 給排水配管事前工事 | | | | ○ | | | | 浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事 | | |
| | | | 換気機器のダクト配管事前工事 | | | | ○ | ○ | | | 浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工 | | |
| 電気 | 給湯機器専用配管事前工事 | | | | ○ | | □ | | 風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事 | | | | |
| | | | 浴室専用電気配線事前工事 | | | | | ○ | | 浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事 | | | |
| システムバス 本体取付・設置 | | 建設工事 外区分 | 架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置 | | | | | | | □ | 浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置 | | |
| | | | 浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置 | | | | | | | | □ | 洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付 | |
| | | | 壁パネルの組立・設置 | | | | | | | | | □ | 浴室パネル部材の加工と組立 |
| | | | 天井・浴槽の組立・設置 | | | | | | | | | □ | 天井部材・浴槽部材の取付 |
| | | | 内装品、器具類の取付・設置【注記 1】 | | | | | | | | | □ | カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付 |
| | | | 水栓類の組立・取付【注記 1】 | | | | | | | | | □ | 水栓類の組立、浴室部材への取付 |
| | | | 浴室専用換気機器の取付【注記 1】 | | | | | | | | | □ | 浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付 |
| | | | 風呂追焚き部品の取付【注記 1】 | | | | | | | | □ | □ | 循環追焚き金具の取付 |
| | | | 浴室内給湯機器用リモコンの取付 | | | | | | | | □ | □ | 専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付 |
| | | | 浴室照明器具の取付 | | | | | | | | | □ | 浴室照明器具の浴室パネル加工・取付 |
| | | | その他浴室関連電化機器の取付【注記 1】 | | | | | | | | | □ | 電化品、オプション品の取付 |
| | | | 浴室ドアの組立・取付 | | | | | | | | | □ | システムバス構成部材のドアの組立・取付 |
| | | | 浴室窓サッシの取付【注記 1】 | | | | | | | | | □ | システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付 |
| | | | 浴室窓枠の組立・取付【注記 1】 | | | | | | | | | □ | システムバス構成部材の窓枠の組立・取付 |
| | | | シリコンの充填 | | | | | | | | | □ | 接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填 |
| | | | 試運転・完成検査【注記 2】 | | | | | | | | | □ | 完成後の試運転、性能確認検査 |
| 設置後工事 | 1 2 3 4 5 6 | 管 大工 電気 | 建築外壁の穴あけ | ○ | | | ○ | | | | 建築壁の躯体加工作業 | | |
| | | | 排気ダクトの敷設工事 | | | | ○ | | | | | 浴室換気機器のダクト敷設工事 | |
| | | | 浴室換気機器と排気ダクト接続工事 | | | | ○ | | | | | 建築側ダクトと換気機器の接続、検査 | |
| | | 管 | 浴室換気機器の電気・アース接続工事 | | | | | ○ | | | | 建築側の屋内配線と配線器具、アース工事 | |
| | | | ウェザーカバーの外壁取付 | | | | | ○ | ○ | | | 建築の外装仕上げ工事 | |
| | | | 給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事 | | | | | ○ | | | | 給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査 | |
| 電気 他 | 建築側排水配管との接続工事【注記 3】 | | | | | ○ | | | | 浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査 | | | |
| | 給湯機器本体工事（試運転・確認） | | | | | ○ | | □ | | 機器の設置工事（ガス、電気工事を含む） | | | |
| | 内装仕上げ工事 | ○ | ○ | | | | | | | 床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事 | | | |
| | | | 浴室用電源配線、接続工事 | | | | | ○ | | 浴室機器の事後電気工事 | | | |
| | | | 浴室天井裏の電源、スイッチ工事 | | | | | ○ | | 浴室全体の電気器具、配線接続工事 | | | |

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
 ※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

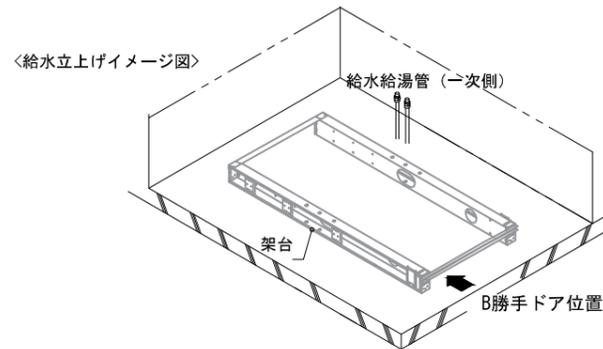

■ 土間コンクリート仕上げ寸法


ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

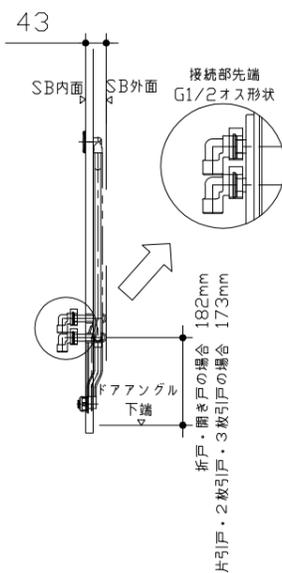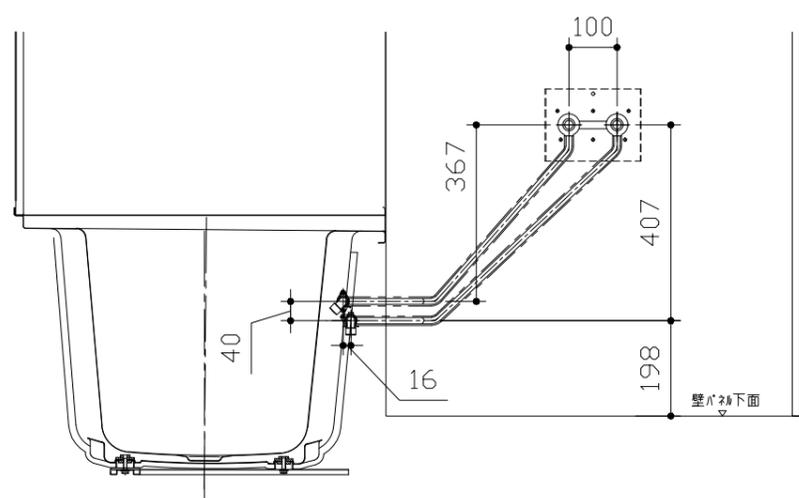

〈給水給湯管取合詳細図〉

■ 設備記号

| 記号 | 記号の意味 |
|----|-------|
| ☒ | 給水位置 |
| ● | 給湯位置 |

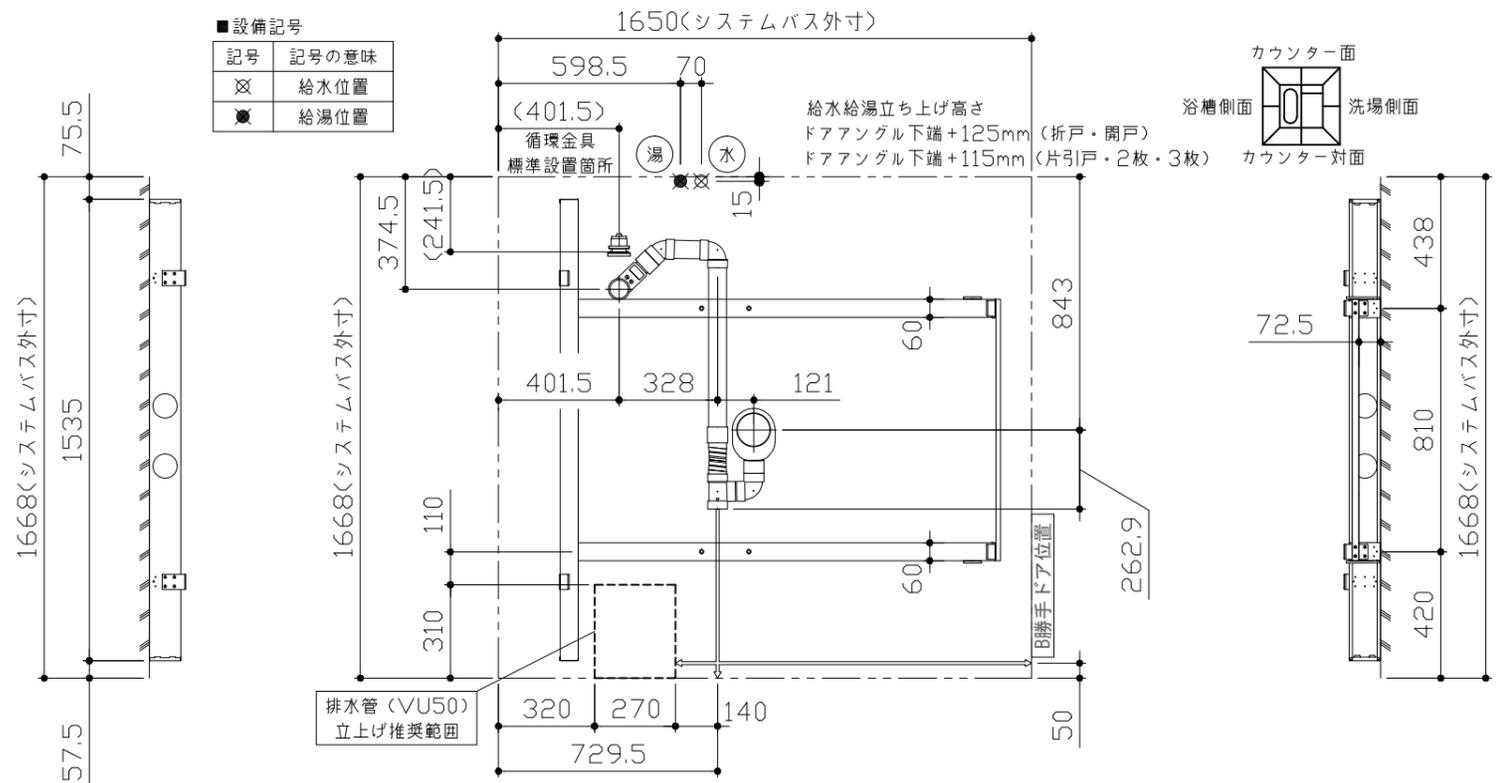

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・カウンター面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

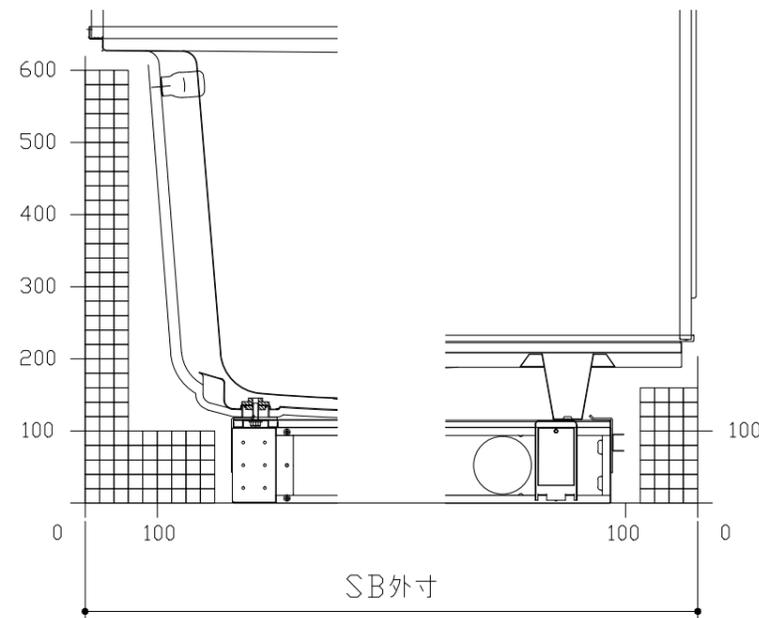


A矢視

B矢視

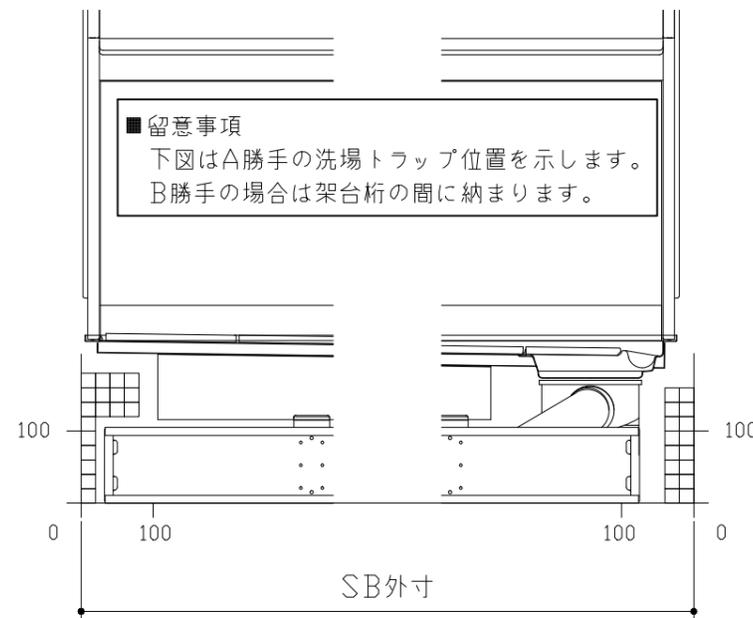


C矢視

D矢視

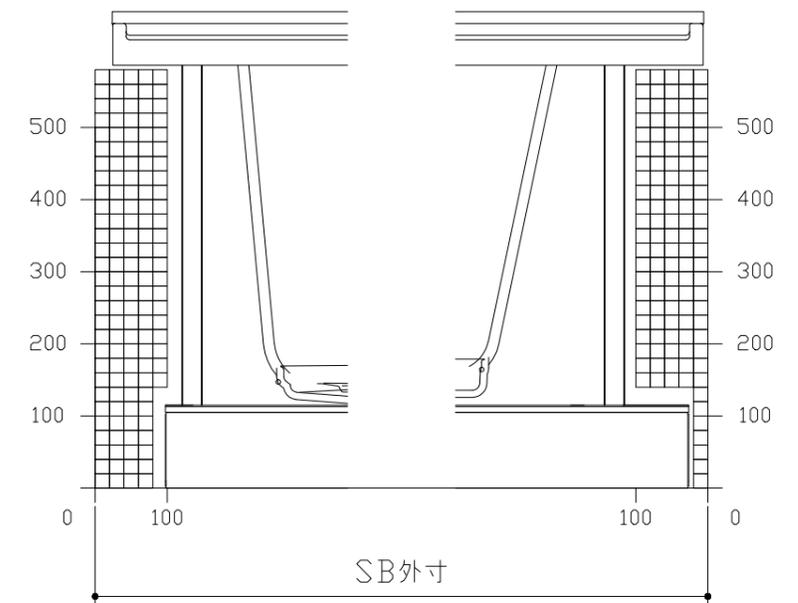

E矢視


F矢視

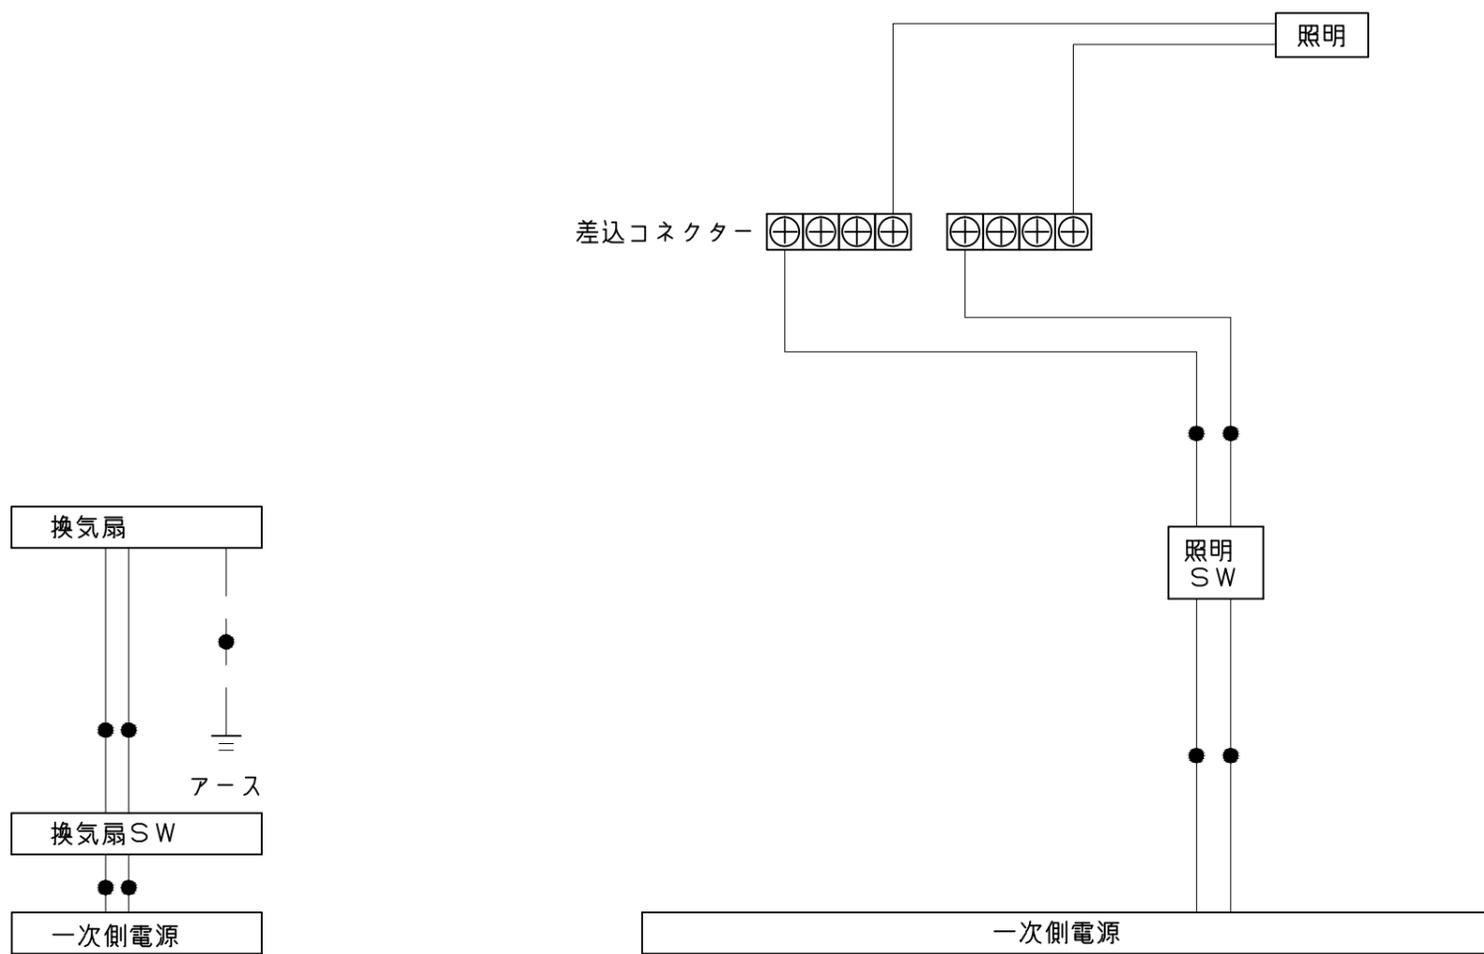


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

浴槽


* 開口1625以下の場合は<>内寸法参照のこと

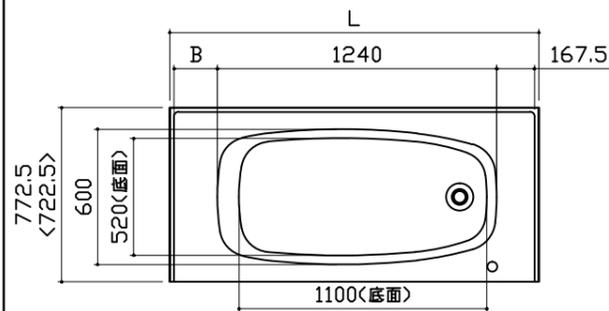

| SB 奥行寸法 | L | B |
|------------|------|-------|
| 1568 | 1539 | 92.5 |
| 1593 | 1564 | 117.5 |
| 1618 | 1589 | 142.5 |
| 1643 | 1614 | 167.5 |
| 1668 | 1639 | 192.5 |
| 1693 | 1664 | 217.5 |
| 1718 | 1689 | 242.5 |
| 1743 | 1714 | 267.5 |
| 1768 | 1739 | 292.5 |
| 1793 | 1764 | 317.5 |
| 1818 | 1789 | 342.5 |
| 1843 | 1814 | 367.5 |
| 1868 | 1839 | 392.5 |




洗い場用水栓

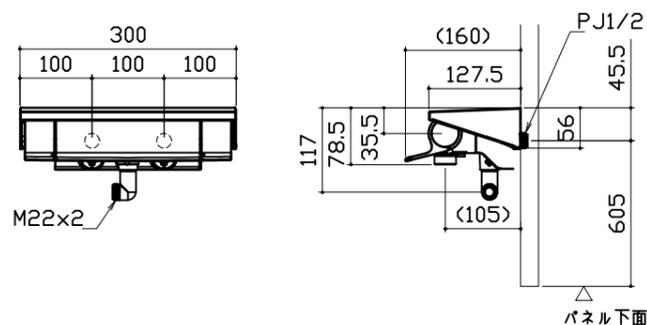


照明

天井付ミニ照明
LED 6.5W (1灯あたり)




換気機器

管工事

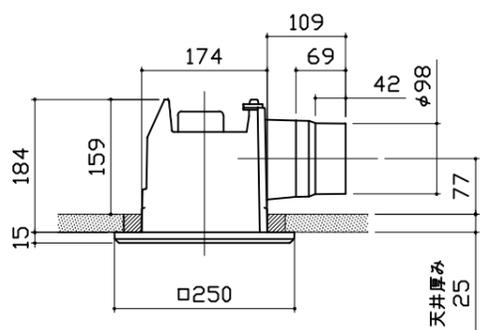


カウンター







本体: ABS

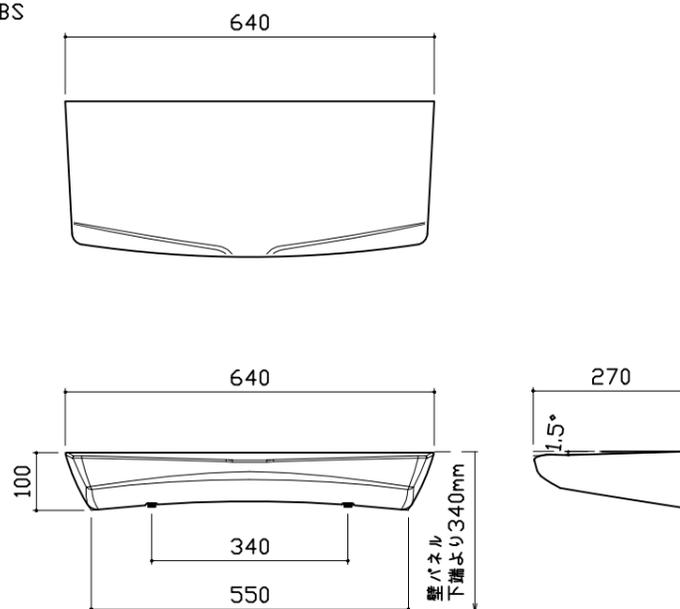


ミラー

枠: SUS304 t0.8
ミラー: 表面防曇コートあり (横長クリアミラー)
表面防曇コートなし (横長ミラー)

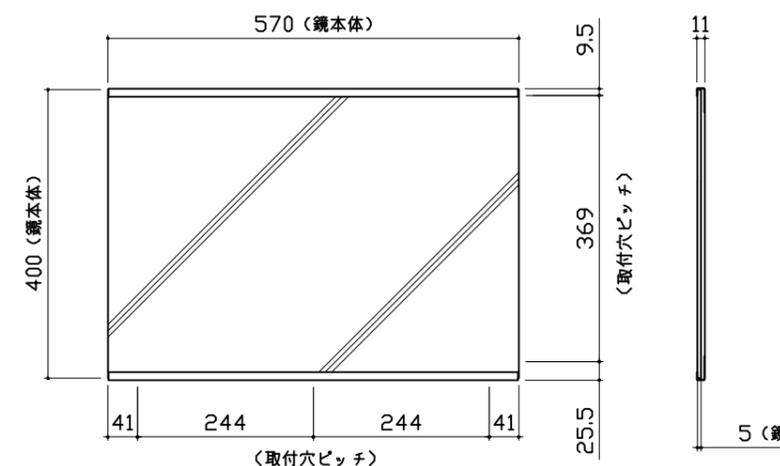

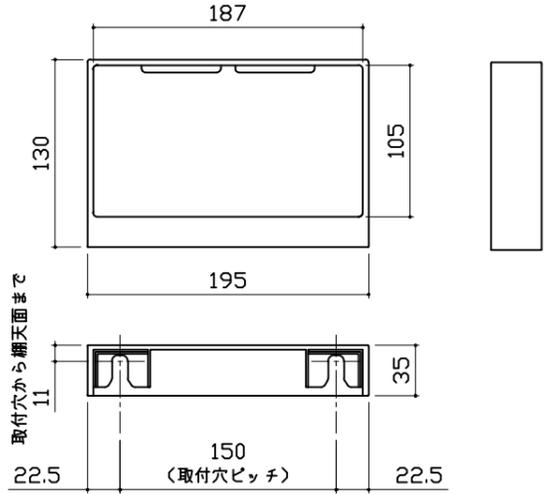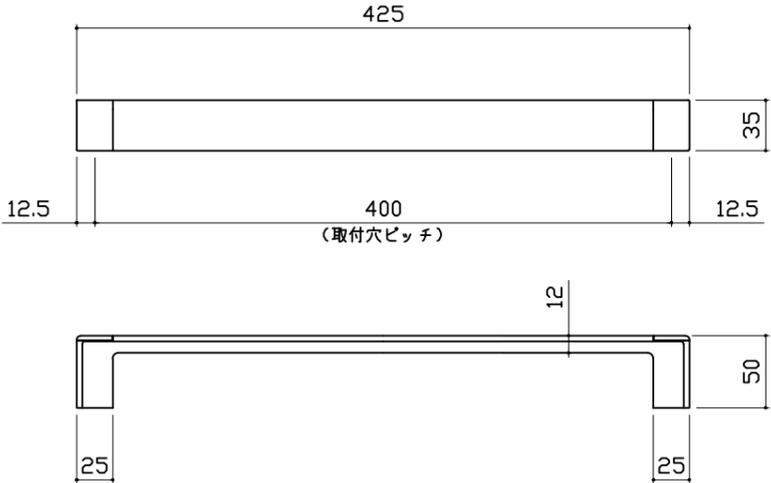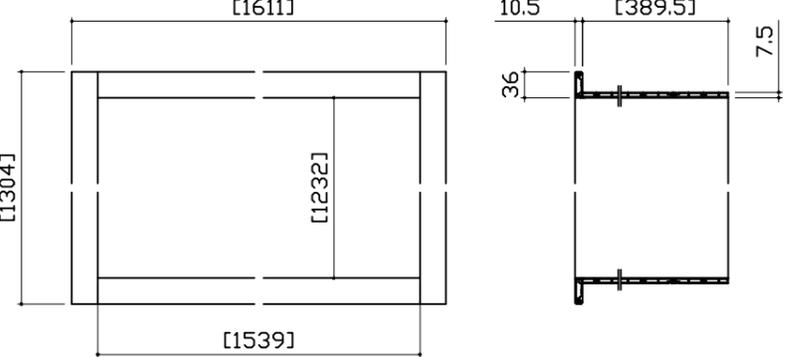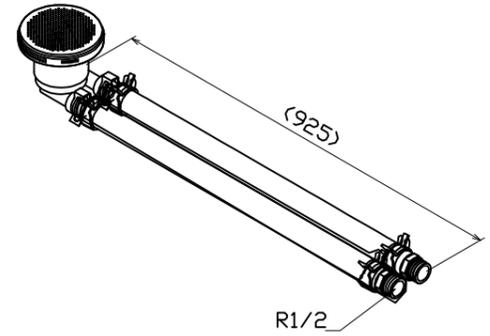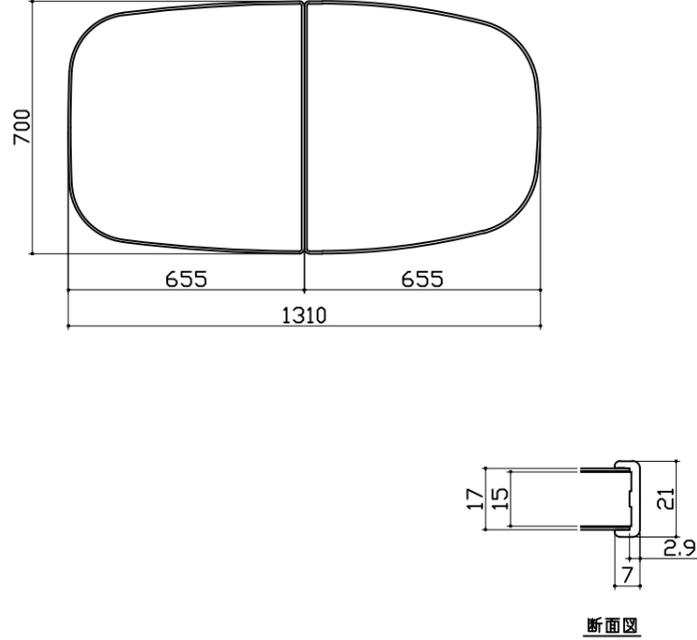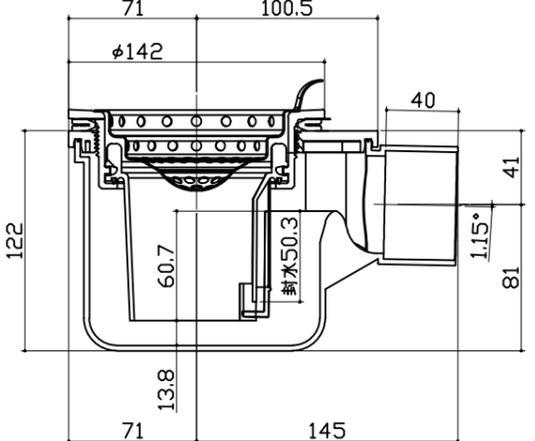
| 収納棚 | タオル掛け | 窓枠フリー | |
|---|--|---|--|
| <p>本体：ABS</p>  | <p>本体：ABS キャップ：ABS</p>  | <p>*[]寸法はそれ以下に現地加工することができます。 *末尾 E：フクビ化学工業製 NG/NW：キョーセイ製 材質：窓枠本体/カバー AESコートABS …L1512(E/NG) AASコートABS …L1512(NW) コーナーピース部 ABS …(E/NW/NG共通)</p>  | |
| 循環金具・フロアダプタ関連 | 風呂蓋 フォワ MLH-1240WN | 洗い場側排水トラップ | |
|  |  <p>断面図</p> |  | |
| <p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p> | <p>現場名称：モガミ住研様企画様邸 現場番号：C3830569 山形営業所</p> | <p>びったりサイズエメロード プラン番号：1305Z-2210-0354F 担当営業：市沢</p> | <p>部材詳細図 2/3 作成日：2022年10月18日 担当アドバイザー：</p> |


浴槽側排水トラップ

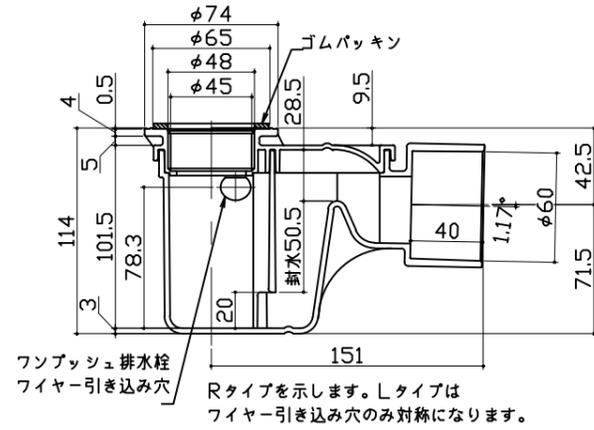


パネル割図

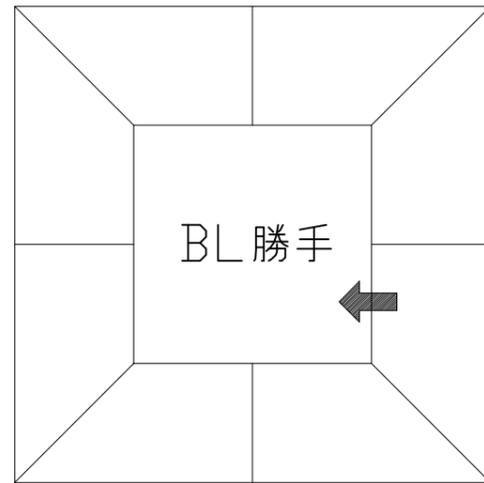


ミラー

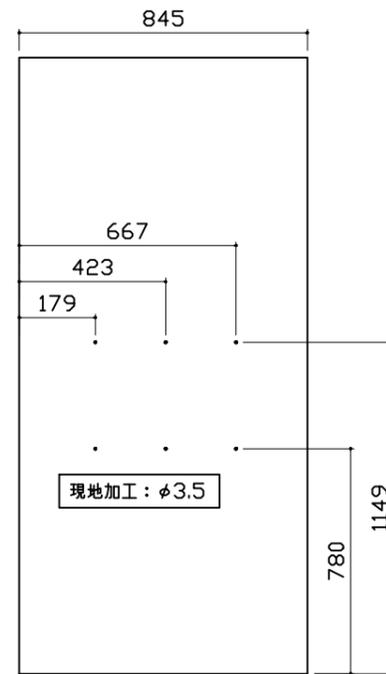

収納棚

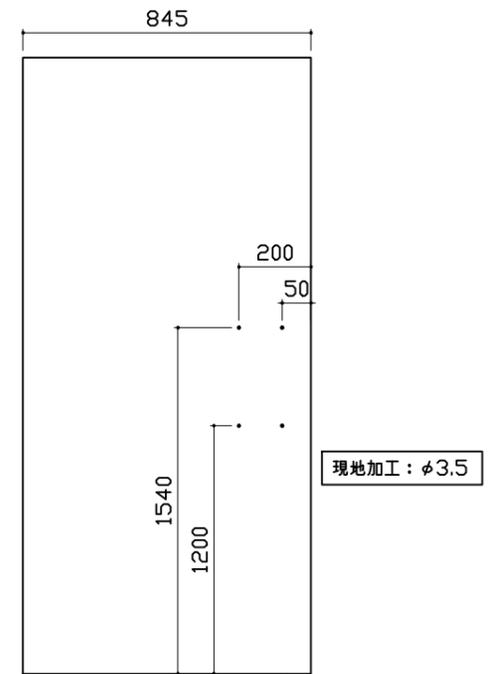

シャーフック

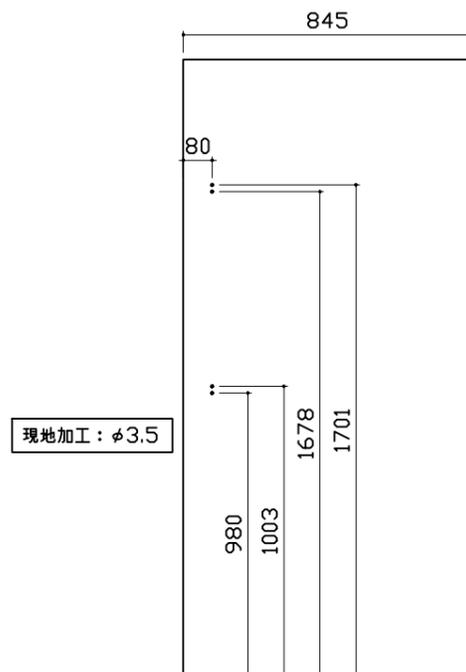



画像はイメージです。

ユニットサイズ / 勝手 間口1650mm × 奥行1668mm / B L

室内高さ : K タイプ

壁カラー:未定

浴室パネル

ハイクラス ※+¥20,000(税抜き)となります。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |

レギュラークラス

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|

浴槽

カラーステンレス浴槽

プレミアムステンレス


ベージュ ピンク

ホワイト

洗い場

キープクリーンフロア

ホワイトグレー

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>カウンター</p> <p>カウンターカラー</p> <p>ホワイト</p> <p>ベージュ</p> <p>チャコールグレー</p> <p>ワイドカウンター</p> | <p>浴槽エプロン</p> <p>カラー</p> <p>ホワイト</p> | <p>水栓</p> <p>洗い場用水栓</p> <p>カラー</p> <p>ホワイト</p> <p>ベージュ</p> <p>チャコールグレー</p> <p>KF9032SJN</p> <p>樹脂ホース(シルバー)</p> <p>節湯B1</p> <p>節湯B</p> | <p>シャワーヘッド</p>  | |
| <p>天井</p> <p>フラット天井 (ホワイト)</p>  | <p>照明</p> <p>天井付ミニ照明</p> <p>昼白色</p>  | <p>換気機器</p> <p>天井換気扇</p> <p>ホワイト</p>  | <p>ドア</p> <p>折戸 (ホワイト)</p> <p>キープクリーンドア</p> <p>バックレス</p> <p>上部換気口</p>  | |
| <p>ミラー</p> <p>横長クリアミラー</p>  | <p>収納棚</p> <p>スクエアタイプ (2段) <カラー: ホワイト></p>  | <p>タオル掛け</p> <p>スクエアタイプ</p>  | <p>浴槽仕様</p> <p>高断熱浴槽</p> <p>お湯が冷めにくいので、次に入る人も快適です。</p> <p>※保温材の表現はイメージです。</p>  | |
| <p>断熱風呂フタ (組み合わせ式)</p>  <p>※浴槽形状により風呂フタの形状は異なります。</p> | <p>高断熱浴槽仕様</p> <p>高断熱浴槽 断熱風呂フタ</p> <p>がセットなら...</p> <p>4時間後の湯温低下をわずか</p> <p>2.5°C以内に抑えます。(JIS 準拠)</p> | <p>浴槽グリップ</p> <p><付き位置></p>  <p>1本付きます。</p> | <p>どこでもラック</p>  <p>風呂フタフック</p> | |
| <p>どこでもラック</p>  <p>タオルハンガーL</p> | <p>窓枠フリータイプ(樹脂製) L1512 ホワイト</p>  | <p>システムバスの特長</p> <p>この心地よさ、タカラオリジナル</p> <p>ピカピカ ポカポカ ガッチリ</p> <p>優れた素材と機能性が実現する快適な浴室。</p> | <p>ホーロークリーン浴室パネル</p> <p>お手入れカンタンで清潔、浴室の壁は高品位ホーロー。</p> <p>毎日シャワーで洗すだけ!</p> <p>湯アカもサッとひと拭き!</p> <p>傷つきにくく汚れにくい!</p>  | |
| <p>キープクリーンフロア</p>  <p>床は表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、お手入れがカンタンです。</p> | <p>排水口カバー (ステンレス)</p>  | <p>パーフェクト保温</p> <p>あたたかさを逃がさない!</p> <p>まるごと包み込むように、浴室全体を保温材で完全防備。</p> <p>断熱材</p> <p>※画像はイメージです。</p>  | <p>震度6強相当の振動にも負けない強度</p> <p>強さの秘密は、浴室の重さをしっかり支えるフレーム架台。</p> <p>システムバス下台部分</p> <p>※画像はイメージです。</p>  | |
| <p>カラーシミュレーション</p>  <p>お好みのカラーの組み合わせが見つかります!</p> | | | | |
